



अमृत महा आवास अभियान २०२२-२३

दैनिक प्रगती अहवाल : २३.०४.२०२३


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – मंजूरी, पूर्ण घरकुले, हप्ते वितरण, भूमिहीन, आर्थिकदृष्ट्या अपुर्ण
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – मंजूरी, पूर्ण घरकुले, हप्ते वितरण, आर्थिकदृष्ट्या अपुर्ण

योजना	एकूण मंजूरी	दैनिक मंजूरी	एकूण पूर्ण	दैनिक पूर्ण घरकुले	दैनिक पहिला हप्ता वितरित	दैनिक दुसरा हप्ता वितरित	दैनिक तिसरा हप्ता वितरित
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण	१४१०८४५	५	१०३६६४८	२९	१८०८	६६२२	४६२३
राज्य योजना	५५५५६८	५२	४०२७२८	०	८४६	५१७	५१९
एकूण	१९६६४१३	५७	१४३९३७६	२९	२६५४	७१३९	५१३४

PMAY-G Completion Progress Bar

73.5%



PMAY-G: Incomplete Houses bifurcation



State Schemes Progress Bar

72.5%



State Schemes: Incomplete Houses bifurcation

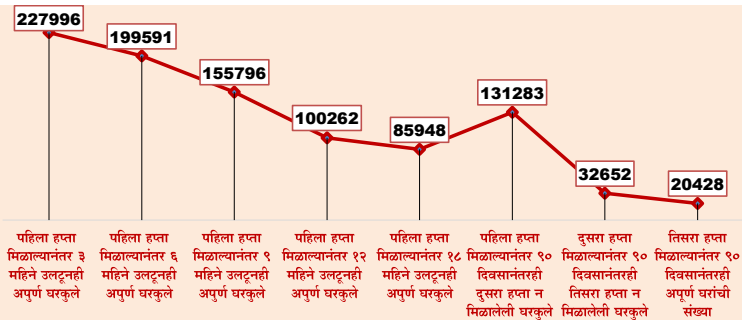


Abhiyan Achievement

Day

154

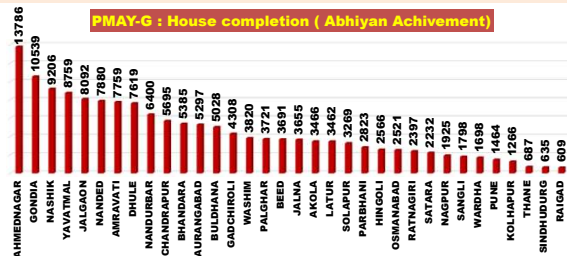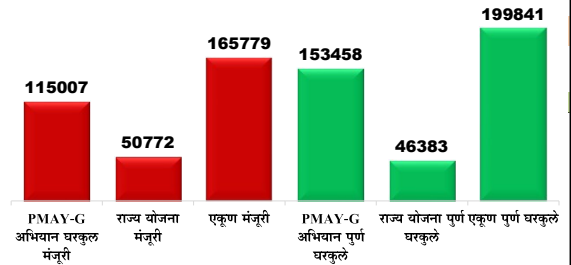

State Schemes: House completion (Abhiyan Achievement)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी (PWL+Awaas Plus)

Sr. No.	Division	Target (PWL+Awaas Plus)	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	NASHIK DIV.	414760	413753	413758	5	1002
2	AMRAVATI DIV.	275029	274584	274584	0	445
3	AURANGABAD DIV.	238068	237420	237420	0	648
4	NAGPUR DIV.	292090	291469	291469	0	621
5	KONKAN DIV.	69785	69636	69636	0	149
6	PUNE DIV.	124804	123978	123978	0	826
Total		1414536	1410840	1410845	5	3691

Sr. No.	District	Target (PWL+Awaas Plus)	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	NASHIK	89720	89663	89668	5	52
2	AHMEDNAGAR	60792	60763	60763	0	29
3	AKOLA	48792	48778	48778	0	14
4	AMRAVATI	95712	95466	95466	0	246
5	AURANGABAD	36795	36666	36666	0	129
6	BEED	35310	35253	35253	0	57
7	BHANDARA	65086	65056	65056	0	30
8	BULDHANA	44766	44714	44714	0	52
9	CHANDRAPUR	43122	42999	42999	0	123
10	DHULE	64979	64917	64917	0	62
11	GADCHIROLI	31698	31619	31619	0	79
12	GONDIA	96492	96142	96142	0	350
13	HINGOLI	18109	18083	18083	0	26
14	JALGAON	79748	79451	79451	0	297
15	JALNA	24039	24022	24022	0	17
16	KOLHAPUR	17685	17685	17685	0	0
17	LATUR	20679	20475	20475	0	204
18	NAGPUR	37059	37047	37047	0	12
19	NANDED	69533	69460	69460	0	73
20	NANDURBAR	119521	118959	118959	0	562
21	OSMANABAD	14506	14401	14401	0	105
22	PALGHAR	35312	35185	35185	0	127
23	PARBHANI	19097	19060	19060	0	37
24	PUNE	20543	20531	20531	0	12
25	RAIGAD	9831	9822	9822	0	9
26	RATNAGIRI	9895	9888	9888	0	7
27	SANGLI	21890	21748	21748	0	142
28	SATARA	15348	15344	15344	0	4
29	SINDHUDURG	5142	5142	5142	0	0
30	SOLAPUR	49338	48670	48670	0	668
31	THANE	9605	9599	9599	0	6
32	WARDHA	18633	18606	18606	0	27
33	WASHIM	20404	20401	20401	0	3
34	YAVATMAL	65355	65225	65225	0	130
Total		1414536	1410840	1410845	5	3691

Remaining Sanction RANK


KOLHAPUR	0
SINDHUDURG	0
WASHIM	3
SATARA	4
THANE	6
RATNAGIRI	7
RAIGAD	9
NAGPUR	12
PUNE	12
AKOLA	14
JALNA	17
HINGOLI	26
WARDHA	27
AHMEDNAGAR	29
BHANDARA	30
PARBHANI	37
BULDHANA	52
NASHIK	52
BEED	57
DHULE	62
NANDED	73
GADCHIROLI	79
OSMANABAD	105
CHANDRAPUR	123
PALGHAR	127
AURANGABAD	129
YAVATMAL	130
SANGLI	142
LATUR	204
AMRAVATI	246
JALGAON	297
GONDIA	350
NANDURBAR	562
SOLAPUR	668

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण : भूमिहीन लाभार्थी अहवाल

Sr. No.	District	Google Sheet Report			AwaasSoft Report			
		Total Landless	Provided land	Remaining	Landless beneficiaries tagged in AwaasSoft	Landless beneficiaries provided land	Remaining Landless	Remaining Tag (provided land)
1	DHULE	18	18	0	18	18	0	0
2	GADCHIROLI	8	8	0	8	8	0	0
3	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0
4	PALGHAR	11	11	0	11	11	0	0
5	RAIGAD	6	6	0	6	6	0	0
6	RATNAGIRI	23	23	0	23	23	0	0
7	SINDHUDURG	420	420	0	420	420	0	0
8	KOLHAPUR	257	257	0	257	227	30	30
9	THANE	127	74	53	127	43	84	31
10	NANDED	362	277	85	362	242	120	35
11	BEED	212	101	111	212	72	140	29
12	SANGLI	431	143	288	430	141	289	2
13	PARBHANI	332	15	317	332	13	319	2
14	SATARA	1309	598	711	1304	628	676	-30
15	NASHIK	1804	1454	350	1804	715	1089	739
16	HINGOLI	1713	787	926	1713	466	1247	321
17	JALNA	1413	165	1248	1381	85	1296	80
18	WARDHA	2819	1284	1535	2803	1214	1589	70
19	NAGPUR	5134	3397	1737	5054	3412	1642	-15
20	GONDIA	2450	2450	0	2450	765	1685	1685
21	CHANDRAPUR	2791	1463	1328	2770	971	1799	492
22	PUNE	2925	992	1933	2924	885	2039	107
23	LATUR	2299	68	2231	2299	66	2233	2
24	OSMANABAD	2470	104	2366	2470	56	2414	48
25	YAVATMAL	3437	1119	2318	3611	1178	2433	-59
26	BHANDARA	5825	3230	2595	5792	3213	2579	17
27	WASHIM	3477	865	2612	3477	850	2627	15
28	AURANGABAD	3328	1779	1549	3328	288	3040	1491
29	AKOLA	7074	3842	3232	7074	3844	3230	-2
30	AHMEDNAGAR	7762	4828	2934	7756	3374	4382	1454
31	JALGAON	22872	21026	1846	22962	17824	5138	3202
32	SOLAPUR	7960	2595	5365	7431	791	6640	1804
33	BULDHANA	15256	8455	6801	15230	7000	8230	1455
34	AMRAVATI	21560	11238	10322	21560	11111	10449	127
	Total	127885	73092	54793	127399	59960	67439	13238

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	Division	Sanction	22.04.2023	23.04.2023	Daily Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 05.06.23
1	AMRAVATI DIV.	274584	185968	185989	21	88595	187	2060
2	AURANGABAD DIV.	237420	139452	139456	4	97964	207	2278
3	KONKAN DIV.	69636	57456	57457	1	12179	52	283
4	PUNE DIV.	123978	87450	87451	1	36527	65	849
5	NASHIK DIV.	413758	328616	328617	1	85141	293	1980
6	NAGPUR DIV.	291469	237677	237678	1	53791	192	1251
Total		1410845	1036619	1036648	29	374197	996	8702

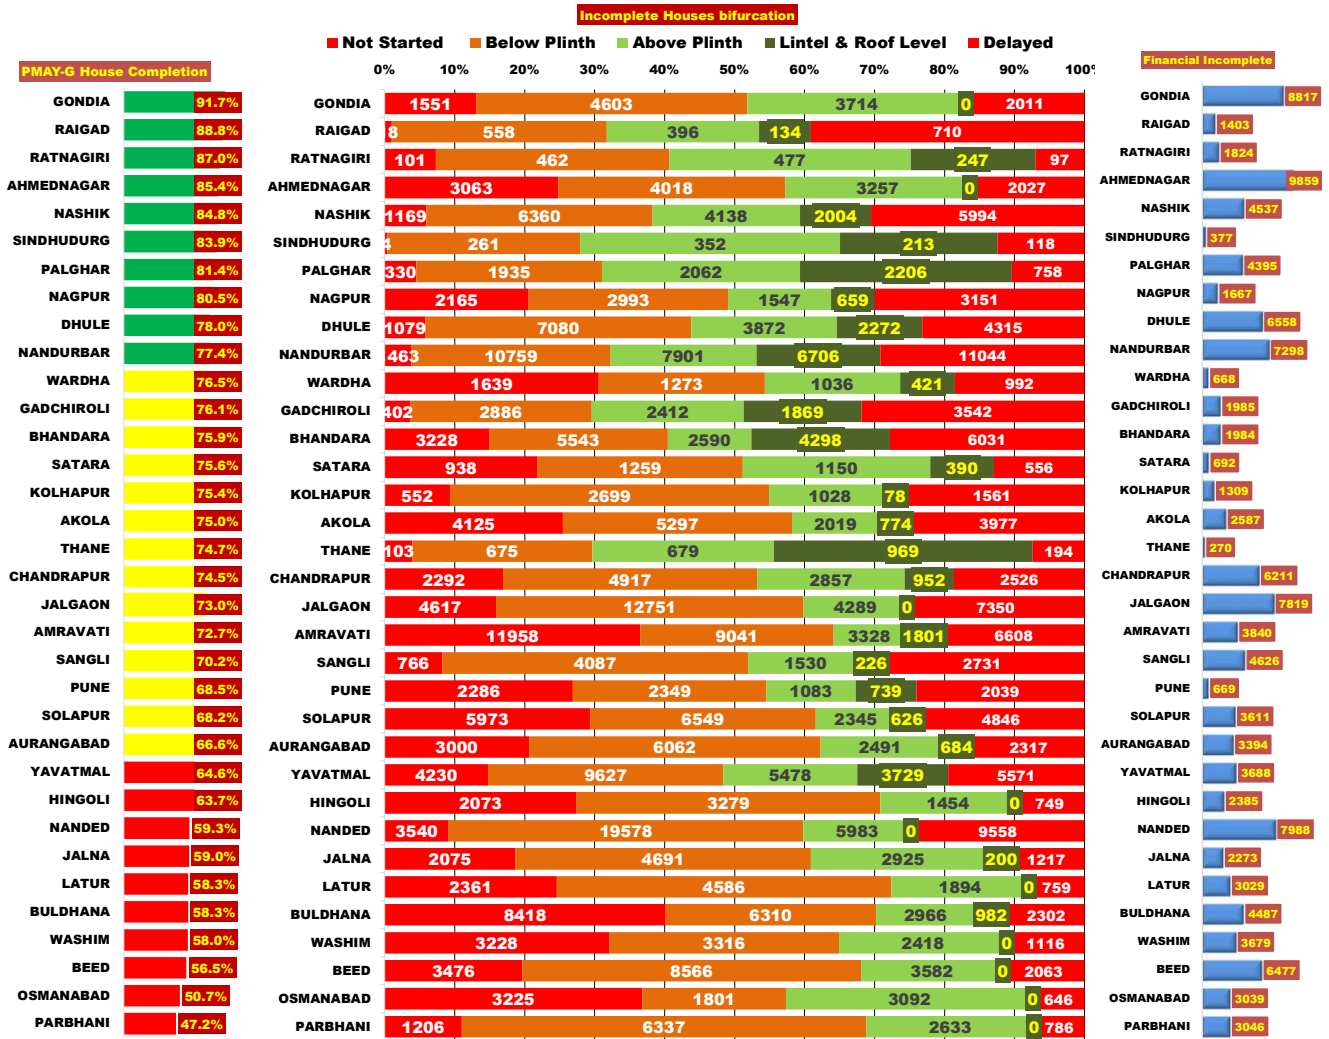

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	District	Sanction	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining	Aug. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 05.06.23
1	AKOLA	48778	36555	36563	8	12215	23	284
2	WASHIM	20401	11819	11826	7	8575	25	199
3	YAVATMAL	65225	42161	42167	6	23058	57	536
4	PARBHANI	19060	8993	8996	3	10064	18	234
5	JALGAON	79451	58009	58010	1	21441	53	499
6	NAGPUR	37047	29817	29818	1	7229	13	168
7	NANDED	69460	41189	41190	1	28270	51	657
8	RATNAGIRI	9888	8600	8601	1	1287	16	30
9	SOLAPUR	48670	33176	33177	1	15493	21	360
10	AHMEDNAGAR	60763	51866	51866	0	8897	90	207
11	AMRAVATI	95466	69384	69384	0	26082	50	607
12	AURANGABAD	36666	24429	24429	0	12237	34	285
13	BEED	35253	19919	19919	0	15334	24	357
14	BHANDARA	65056	49397	49397	0	15659	35	364
15	BULDHANA	44714	26049	26049	0	18665	33	434
16	CHANDRAPUR	42999	32034	32034	0	10965	37	255
17	DHULE	64917	50614	50614	0	14303	49	333
18	GADCHIROLI	31619	24075	24075	0	7544	28	175
19	GONDIA	96142	88117	88117	0	8025	68	187
20	HINGOLI	18083	11524	11524	0	6559	17	153
21	JALNA	24022	14161	14161	0	9861	24	229
22	KOLHAPUR	17685	13328	13328	0	4357	8	101
23	LATUR	20475	11936	11936	0	8539	22	199
24	NANDURBAR	118959	92130	92130	0	26829	42	624
25	NASHIK	89668	75997	75997	0	13671	60	318
26	OSMANABAD	14401	7301	7301	0	7100	16	165
27	PALGHAR	35185	28652	28652	0	6533	24	152
28	PUNE	20531	14074	14074	0	6457	10	150
29	RAIGAD	9822	8719	8719	0	1103	4	26
30	SANGLI	21748	15265	15265	0	6483	12	151
31	SATARA	15344	11607	11607	0	3737	14	87
32	SINDHUDURG	5142	4312	4312	0	830	4	19
33	THANE	9599	7173	7173	0	2426	4	56
34	WARDHA	18606	14237	14237	0	4369	11	102
Total		1410845	1036619	1036648	29	374197	996	8702

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी

Sr. No.	Division	Target	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	NAGPUR DIV.	118393	91848	91888	40	26505
2	AURANGABAD DIV.	199331	165385	165395	10	33936
3	NASHIK DIV.	141360	110539	110541	2	30819
4	KONKAN DIV.	34732	31053	31053	0	3679
5	PUNE DIV.	65334	62997	62997	0	2337
6	AMRAVATI DIV.	109702	93694	93694	0	16008
Total		668852	555516	555568	52	113284


Sr. No.	District	Target	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	CHANDRAPUR	40285	25893	25933	40	14352
2	NANDED	26760	20860	20870	10	5890
3	JALGAON	25659	22538	22540	2	3119
4	AHMEDNAGAR	35298	32973	32973	0	2325
5	AKOLA	23681	17733	17733	0	5948
6	AMRAVATI	23224	19812	19812	0	3412
7	AURANGABAD	26141	23842	23842	0	2299
8	BEED	26878	25076	25076	0	1802
9	BHANDARA	17590	15558	15558	0	2032
10	BULDHANA	21616	19979	19979	0	1637
11	DHULE	21790	18048	18048	0	3742
12	GADCHIROLI	16834	15203	15203	0	1631
13	GONDIA	14246	12846	12846	0	1400
14	HINGOLI	27298	15514	15514	0	11784
15	JALNA	20446	19228	19228	0	1218
16	KOLHAPUR	12565	12528	12528	0	37
17	LATUR	27171	26199	26199	0	972
18	NAGPUR	16291	11130	11130	0	5161
19	NANDURBAR	26578	14137	14137	0	12441
20	NASHIK	32035	22843	22843	0	9192
21	OSMANABAD	24853	17039	17039	0	7814
22	PALGHAR	11792	11002	11002	0	790
23	PARBHANI	19784	17627	17627	0	2157
24	PUNE	14672	12774	12774	0	1898
25	RAIGAD	7406	6302	6302	0	1104
26	RATNAGIRI	7129	6677	6677	0	452
27	SANGLI	8732	8603	8603	0	129
28	SATARA	10647	10647	10647	0	0
29	SINDHUDURG	2141	2107	2107	0	34
30	SOLAPUR	18718	18445	18445	0	273
31	THANE	6264	4965	4965	0	1299
32	WARDHA	13147	11218	11218	0	1929
33	WASHIM	11500	10057	10057	0	1443
34	YAVATMAL	29681	26113	26113	0	3568
Total		668852	555516	555568	52	113284

Remaining Sanction RANK

SATARA	0
SINDHUDURG	34
KOLHAPUR	37
SANGLI	129
SOLAPUR	273
RATNAGIRI	452
PALGHAR	790
LATUR	972
RAIGAD	1104
JALNA	1218
THANE	1299
GONDIA	1400
WASHIM	1443
GADCHIROLI	1631
BULDHANA	1637
BEED	1802
PUNE	1898
WARDHA	1929
BHANDARA	2032
PARBHANI	2157
AURANGABAD	2299
AHMEDNAGAR	2325
JALGAON	3119
AMRAVATI	3412
YAVATMAL	3568
DHULE	3742
NAGPUR	5161
NANDED	5890
AKOLA	5948
OSMANABAD	7814
NASHIK	9192
HINGOLI	11784
NANDURBAR	12441
CHANDRAPUR	14352

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	Division	Sanction	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 05.06.23
1	KONKAN DIV.	31053	23668	23668	0	7385	15	172
2	PUNE DIV.	62997	51976	51976	0	11021	25	256
3	NASHIK DIV.	110541	88956	88956	0	21585	71	502
4	AURANGABAD DIV.	165395	103957	103957	0	61438	90	1429
5	AMRAVATI DIV.	93694	64777	64777	0	28917	56	672
6	NAGPUR DIV.	91888	69394	69394	0	22494	44	523
Total		555568	402728	402728	0	152840	301	3554

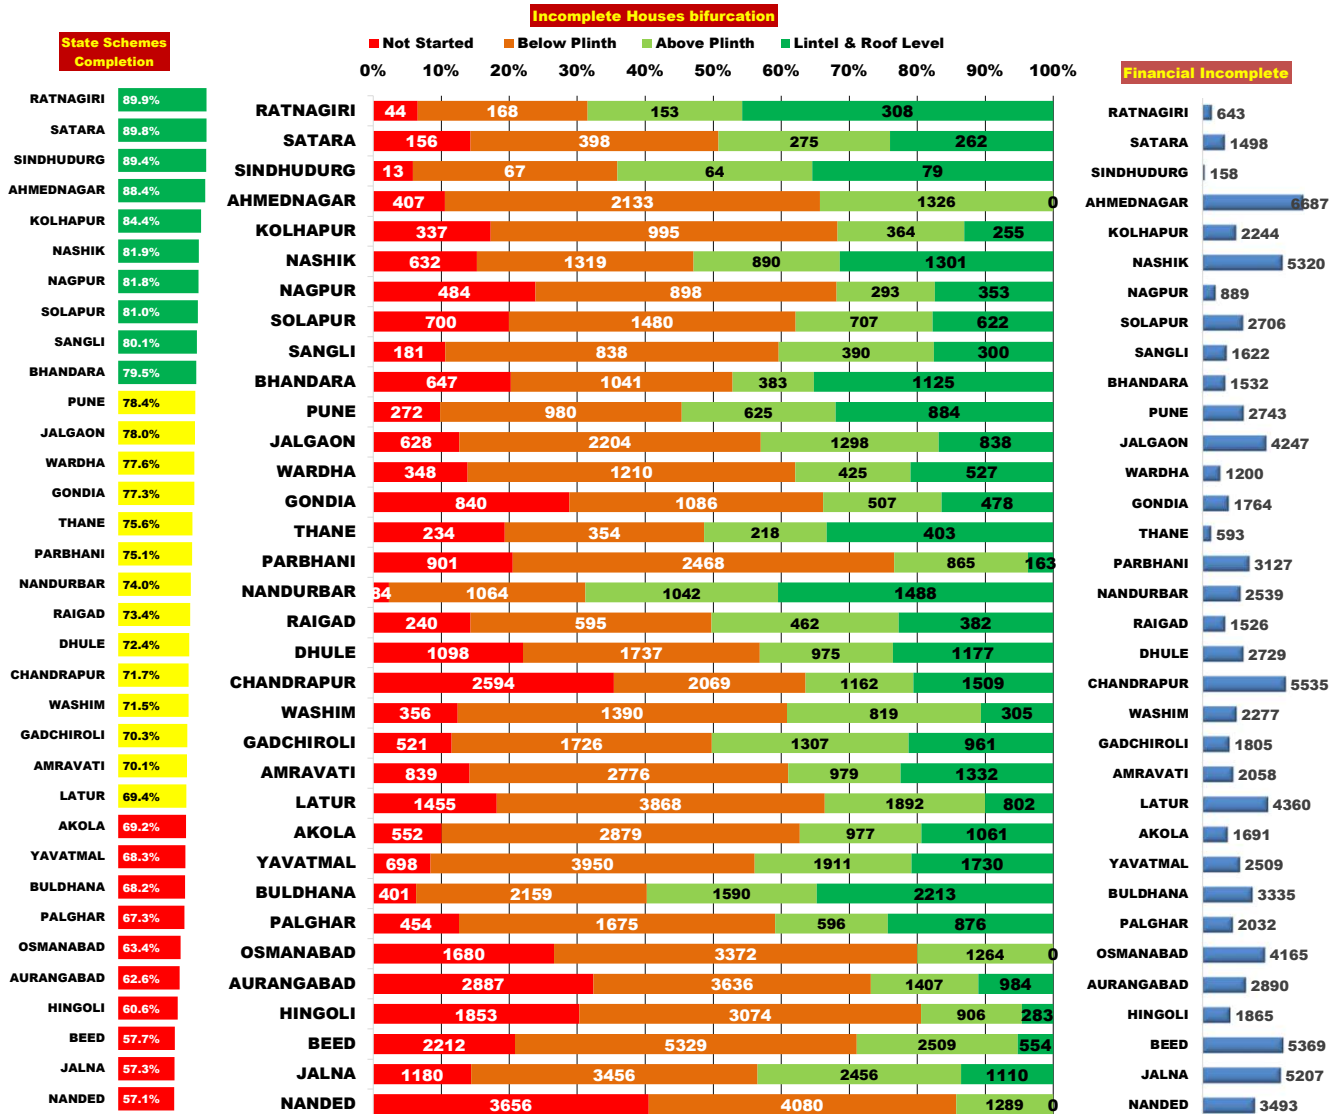

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	District	Sanction	22.04.2023	23.04.2023	Daily_Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 05.06.23
1	AHMEDNAGAR	32973	29163	29163	0	3810	29	89
2	AKOLA	17733	12264	12264	0	5469	9	127
3	AMRAVATI	19812	13886	13886	0	5926	9	138
4	AURANGABAD	23842	14928	14928	0	8914	9	207
5	BEED	25076	14472	14472	0	10604	14	247
6	BHANDARA	15558	12362	12362	0	3196	4	74
7	BULDHANA	19979	13616	13616	0	6363	17	148
8	CHANDRAPUR	25933	18599	18599	0	7334	13	171
9	DHULE	18048	13061	13061	0	4987	10	116
10	GADCHIROLI	15203	10688	10688	0	4515	9	105
11	GONDIA	12846	9935	9935	0	2911	8	68
12	HINGOLI	15514	9398	9398	0	6116	6	142
13	JALGAON	22540	17572	17572	0	4968	12	116
14	JALNA	19228	11026	11026	0	8202	25	191
15	KOLHAPUR	12528	10577	10577	0	1951	3	45
16	LATUR	26199	18182	18182	0	8017	13	186
17	NAGPUR	11130	9102	9102	0	2028	4	47
18	NANDED	20870	11923	11923	0	8947	9	208
19	NANDURBAR	14137	10459	10459	0	3678	6	86
20	NASHIK	22843	18701	18701	0	4142	13	96
21	OSMANABAD	17039	10798	10798	0	6241	10	145
22	PALGHAR	11002	7401	7401	0	3601	6	84
23	PARBHANI	17627	13230	13230	0	4397	4	102
24	PUNE	12774	10013	10013	0	2761	6	64
25	RAIGAD	6302	4623	4623	0	1679	3	39
26	RATNAGIRI	6677	6004	6004	0	673	3	16
27	SANGLI	8603	6894	6894	0	1709	4	40
28	SATARA	10647	9556	9556	0	1091	6	25
29	SINDHUDURG	2107	1884	1884	0	223	1	5
30	SOLAPUR	18445	14936	14936	0	3509	7	82
31	THANE	4965	3756	3756	0	1209	2	28
32	WARDHA	11218	8708	8708	0	2510	7	58
33	WASHIM	10057	7187	7187	0	2870	8	67
34	YAVATMAL	26113	17824	17824	0	8289	13	193
	Total	555568	402728	402728	0	152840	301	3554

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - हप्ते वितरण

Sr. No.	Division	1st Installment (Daily Achievement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achievement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achievement)	3rd Installment Remaining
1	AURANGABAD DIV.	485	20926	2379	54900	917	24054
2	AMRAVATI DIV.	655	31893	1669	33591	1279	16209
3	NASHIK DIV.	295	11391	1212	40968	1028	23457
4	NAGPUR DIV.	212	11064	869	22215	804	14156
5	PUNE DIV.	142	10389	346	16943	309	7136
6	KONKAN DIV.	19	553	147	3891	286	3966
	Total	1808	86216	6622	172508	4623	88978

PMAY-G 1st Ins Pending

SINDHUDURG	4
RAIGAD	15
RATNAGIRI	101
THANE	103
PALGHAR	330
GADCHIROLI	377
KOLHAPUR	552
SANGLI	640
SATARA	938
DHULE	1079
NASHIK	1169
PARBHANI	1206
NANDURBAR	1463
GONDIA	1551
WARDHA	1639
NAGPUR	2030
JALNA	2045
HINGOLI	2073
CHANDRAPUR	2239
PUNE	2286
LATUR	2361
AURANGABAD	3000
AHMEDNAGAR	3063
OSMANABAD	3225
WASHIM	3225
BHANDARA	3228
BEED	3476
NANDED	3540
AKOLA	4125
YAVATMAL	4224
JALGAON	4617
SOLAPUR	5973
BULDHANA	8407
AMRAVATI	11912

PMAY-G 2nd Ins Pending

SINDHUDURG	261
RATNAGIRI	462
RAIGAD	558
THANE	675
SATARA	1259
WARDHA	1273
OSMANABAD	1801
PALGHAR	1935
PUNE	2349
KOLHAPUR	2699
GADCHIROLI	2886
NAGPUR	2993
HINGOLI	3279
WASHIM	3316
AHMEDNAGAR	4018
SANGLI	4087
LATUR	4586
GONDIA	4603
JALNA	4691
CHANDRAPUR	4917
AKOLA	5297
BHANDARA	5543
AURANGABAD	6062
BULDHANA	6310
PARBHANI	6337
NASHIK	6360
SOLAPUR	6549
DHULE	7080
BEED	8566
AMRAVATI	9041
YAVATMAL	9627
NANDURBAR	10759
JALGAON	12751
NANDED	19578

PMAY-G 3rd Ins Pending

SINDHUDURG	352
RAIGAD	396
RATNAGIRI	477
THANE	679
KOLHAPUR	1028
WARDHA	1036
PUNE	1083
SATARA	1150
HINGOLI	1454
SANGLI	1530
NAGPUR	1547
LATUR	1894
AKOLA	2019
PALGHAR	2062
SOLAPUR	2345
GADCHIROLI	2412
WASHIM	2418
AURANGABAD	2491
BHANDARA	2590
PARBHANI	2633
CHANDRAPUR	2857
JALNA	2925
BULDHANA	2966
OSMANABAD	3092
AHMEDNAGAR	3257
AMRAVATI	3328
BEED	3582
GONDIA	3714
DHULE	3872
NASHIK	4138
JALGAON	4289
YAVATMAL	5478
NANDED	5983
NANDURBAR	7901

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - हप्ते वितरण

Sr. No.	District	1st Installment (Daily Achivement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achivement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achivement)	3rd Installment Remaining
1	YAVATMAL	130	4224	472	9627	370	5478
2	JALGAON	47	4617	532	12751	302	4289
3	BULDHANA	223	8407	376	6310	278	2966
4	PARBHANI	68	1206	565	6337	198	2633
5	AMRAVATI	166	11912	388	9041	272	3328
6	JALNA	31	2045	628	4691	94	2925
7	WASHIM	45	3225	331	3316	305	2418
8	AHMEDNAGAR	83	3063	150	4018	377	3257
9	BEED	172	3476	225	8566	141	3582
10	LATUR	66	2361	274	4586	149	1894
11	CHANDRAPUR	46	2239	216	4917	214	2857
12	GONDIA	63	1551	196	4603	196	3714
13	NANDED	38	3540	271	19578	141	5983
14	NASHIK	53	1169	192	6360	173	4138
15	SANGLI	58	640	168	4087	153	1530
16	BHANDARA	26	3228	180	5543	136	2590
17	DHULE	72	1079	169	7080	91	3872
18	GADCHIROLI	31	377	125	2886	154	2412
19	OSMANABAD	42	3225	209	1801	54	3092
20	NANDURBAR	40	1463	169	10759	85	7901
21	AKOLA	91	4125	102	5297	54	2019
22	SOLAPUR	58	5973	85	6549	70	2345
23	HINGOLI	20	2073	147	3279	43	1454
24	AURANGABAD	48	3000	60	6062	97	2491
25	PALGHAR	12	330	64	1935	118	2062
26	NAGPUR	20	2030	96	2993	45	1547
27	WARDHA	26	1639	56	1273	59	1036
28	THANE	0	103	32	675	62	679
29	SATARA	19	938	32	1259	27	1150
30	KOLHAPUR	1	552	37	2699	39	1028
31	RATNAGIRI	6	101	30	462	39	477
32	SINDHUDURG	1	4	12	261	45	352
33	PUNE	6	2286	24	2349	20	1083
34	RAIGAD	0	15	9	558	22	396
	Total	1808	86216	6622	172508	4623	88978

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - हप्ते वितरण

Sr. No.	Division	1st Installment (Daily Achievement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achievement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achievement)	3rd Installment Remaining
1	NASHIK DIV.	344	2849	86	8457	72	5531
2	AURANGABAD DIV.	127	15824	172	29283	149	12588
3	AMRAVATI DIV.	96	2846	130	13154	143	6276
4	NAGPUR DIV.	114	5434	81	8030	83	4077
5	KONKAN DIV.	159	985	32	2859	50	1493
6	PUNE DIV.	6	1646	16	4691	14	2361
Total		846	29584	517	66474	511	32326

State Schemes 1st Ins Pending

SINDHUDURG	13
RATNAGIRI	44
NANDURBAR	84
SATARA	156
SANGLI	181
THANE	234
RAIGAD	240
PUNE	272
KOLHAPUR	337
WARDHA	348
WASHIM	356
BULDHANA	401
AHMEDNAGAR	407
PALGHAR	454
NAGPUR	484
GADCHIROLI	521
AKOLA	552
JALGAON	628
NASHIK	632
BHANDARA	647
YAVATMAL	698
SOLAPUR	700
AMRAVATI	839
GONDIA	840
PARBHANI	901
DHULE	1098
JALNA	1180
LATUR	1455
OSMANABAD	1680
HINGOLI	1853
BEED	2212
CHANDRAPUR	2594
AURANGABAD	2887
NANDED	3656

State Schemes 2nd Ins Pending

SINDHUDURG	67
RATNAGIRI	168
THANE	354
SATARA	398
RAIGAD	595
SANGLI	838
NAGPUR	898
PUNE	980
KOLHAPUR	995
BHANDARA	1041
NANDURBAR	1064
GONDIA	1086
WARDHA	1210
NASHIK	1319
WASHIM	1390
SOLAPUR	1480
PALGHAR	1675
GADCHIROLI	1726
DHULE	1737
CHANDRAPUR	2069
AHMEDNAGAR	2133
BULDHANA	2159
JALGAON	2204
PARBHANI	2468
AMRAVATI	2776
AKOLA	2879
HINGOLI	3074
OSMANABAD	3372
JALNA	3456
AURANGABAD	3636
LATUR	3868
YAVATMAL	3950
NANDED	4080
BEED	5329

State Schemes 3rd Ins Pending

SINDHUDURG	64
RATNAGIRI	153
THANE	218
SATARA	275
NAGPUR	293
KOLHAPUR	364
BHANDARA	383
SANGLI	390
WARDHA	425
RAIGAD	462
GONDIA	507
PALGHAR	596
PUNE	625
SOLAPUR	707
WASHIM	819
PARBHANI	865
NASHIK	890
HINGOLI	906
DHULE	975
AKOLA	977
AMRAVATI	979
NANDURBAR	1042
CHANDRAPUR	1162
OSMANABAD	1264
NANDED	1289
JALGAON	1298
GADCHIROLI	1307
AHMEDNAGAR	1326
AURANGABAD	1407
BULDHANA	1590
LATUR	1892
YAVATMAL	1911
JALNA	2456
BEED	2509

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण -हप्ते वितरण

Sr. No.	District	1st Installment (Daily Achievement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achievement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achievement)	3rd Installment Remaining
1	DHULE	327	1098	23	1737	28	975
2	PALGHAR	159	454	22	1675	28	596
3	YAVATMAL	55	698	55	3950	52	1911
4	LATUR	52	1455	47	3868	49	1892
5	AMRAVATI	39	839	40	2776	39	979
6	JALNA	0	1180	56	3456	55	2456
7	CHANDRAPUR	55	2594	16	2069	17	1162
8	AKOLA	2	552	32	2879	44	977
9	NANDED	20	3656	32	4080	11	1289
10	GONDIA	24	840	27	1086	11	507
11	HINGOLI	31	1853	13	3074	11	906
12	GADCHIROLI	2	521	16	1726	36	1307
13	AHMEDNAGAR	6	407	13	2133	23	1326
14	JALGAON	7	628	31	2204	3	1298
15	NAGPUR	18	484	14	898	7	293
16	AURANGABAD	18	2887	2	3636	9	1407
17	NASHIK	0	632	10	1319	14	890
18	WARDHA	13	348	6	1210	3	425
19	BEED	1	2212	4	5329	12	2509
20	NANDURBAR	4	84	9	1064	4	1042
21	SOLAPUR	2	700	7	1480	7	707
22	OSMANABAD	0	1680	15	3372	0	1264
23	RAIGAD	0	240	10	595	5	462
24	BHANDARA	2	647	2	1041	9	383
25	BULDHANA	0	401	3	2159	8	1590
26	RATNAGIRI	0	44	0	168	11	153
27	PARBHANI	5	901	3	2468	2	865
28	KOLHAPUR	0	337	4	995	4	364
29	SATARA	4	156	1	398	2	275
30	SANGLI	0	181	4	838	1	390
31	THANE	0	234	0	354	5	218
32	SINDHUDURG	0	13	0	67	1	64
33	PUNE	0	272	0	980	0	625
34	WASHIM	0	356	0	1390	0	819
	Total	846	29584	517	66474	511	32326

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - Delayed Houses

■ पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर १२ महिने उलटूनही अपूर्ण घरकुले
 ■ पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर १८ महिने उलटूनही अपूर्ण घरकुले
 ■ पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर १० दिवसानंतरही दुसरा हप्ता न मिळालेले घरकुले
■ दुसरा हप्ता मिळाल्यानंतर १० दिवसानंतरही तिसरा हप्ता न मिळालेले घरकुले
 ■ तिसरा हप्ता मिळाल्यानंतर १० दिवसानंतरही अपूर्ण घरांची संख्या

AHMEDNAGAR	2027	1813	3022	1341	49
AKOLA	3977	3562	3582	879	586
AMRAVATI	6608	5641	7224	1440	996
AURANGABAD	2317	2276	4924	1017	383
BEED	2063	1872	6696	1609	408
BHANDARA	6031	5311	4948	747	2110
BULDHANA	2302	2167	4015	827	671
CHANDRAPUR	2526	1947	3518	683	279
DHULE	4315	4109	5994	2132	1501
GADCHIROLI	3542	2507	2331	1181	843
GONDIA	2011	1980	3094	1021	152
HINGOLI	749	672	2552	445	93
JALGAON	7350	6658	11347	1972	621
JALNA	1217	1075	3160	774	257
KOLHAPUR	1561	755	2393	277	90
LATUR	759	732	2710	426	53
NAGPUR	3151	2377	2585	459	586
NANDED	9558	9170	14842	1911	342
NANDURBAR	11044	10059	7046	4598	5019
NASHIK	5994	3596	4876	2083	1521
OSMANABAD	646	581	1237	439	6
PALGHAR	758	659	1380	542	363
PARBHANI	786	737	4064	492	78
PUNE	2039	1744	1942	478	425
RAIGAD	710	240	472	220	160
RATNAGIRI	97	47	349	93	44
SANGLI	2731	2324	3486	511	119
SATARA	556	393	889	199	137
SINDHUDURG	118	90	207	69	24
SOLAPUR	4846	4633	5013	1234	489
THANE	194	188	579	151	89
WARDHA	992	812	943	212	227
WASHIM	1116	866	2658	386	99
YAVATMAL	5571	4355	7205	1804	1608
