



अमृत महा आवास अभियान २०२२-२३

दैनिक प्रगती अहवाल : ११.०३.२०२३


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – मंजूरी, पूर्ण घरकुले, हप्ते वितरण राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – मंजूरी, पूर्ण घरकुले, हप्ते वितरण

योजना	एकूण मंजूरी	दैनिक मंजूरी	एकूण पूर्ण	दैनिक पूर्ण घरकुले	दैनिक पहिला हप्ता वितरित	दैनिक दुसरा हप्ता वितरित	दैनिक तिसरा हप्ता वितरित
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण	१४१४१७८	५१	९९६२९३	८७०	९६२	१४५१	११२८
राज्य योजना	५३८९२६	११५०	३९०७४६	३६०	७९८	६३०	७३९
एकूण	१९५३१०४	१२०१	१३८७०३९	१२३०	१७६०	२०८१	१८६७

PMAY-G Completion Progress Bar

70.5%


PMAY-G: Incomplete Houses bifurcation

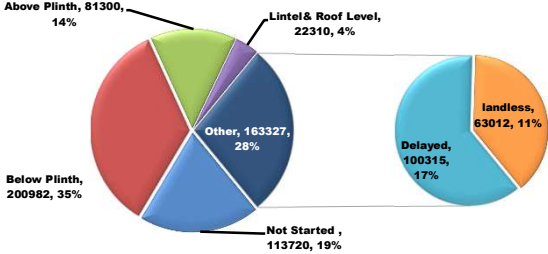


State Schemes Progress Bar

72.5%

State Schemes: Incomplete Houses bifurcation

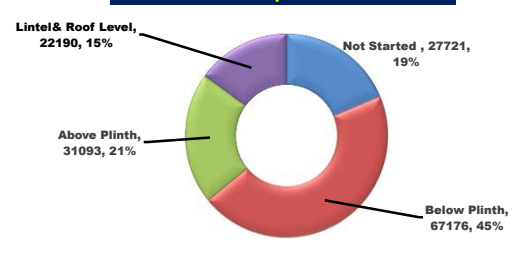


Delayed Houses Bifurcation

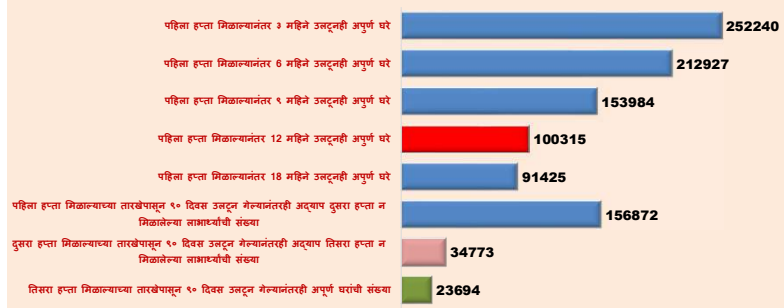


Abhiyan Achievement


Day 111

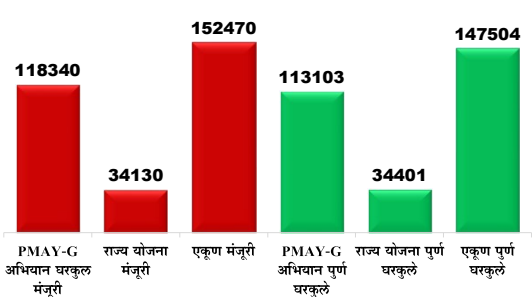

PMAY-G : House completion (Abhiyan Achievement)



State Schemes : House completion (Abhiyan Achievement)




राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी (PWL+Awaas Plus)

Sr. No.	Division	Target (PWL+Awaas Plus)	10.03.2023	11.03.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	AURANGABAD DIV.	238309	237916	237931	27	378
2	NASHIK DIV.	414565	413844	413829	19	736
3	NAGPUR DIV.	292425	291877	291869	5	556
4	AMRAVATI DIV.	274985	274681	274674	0	311
5	KONKAN DIV.	69682	69655	69652	0	30
6	PUNE DIV.	126512	126288	126223	0	289
	Total	1416478	1414261	1414178	51	2300

PMAY-G Remaining Sanction

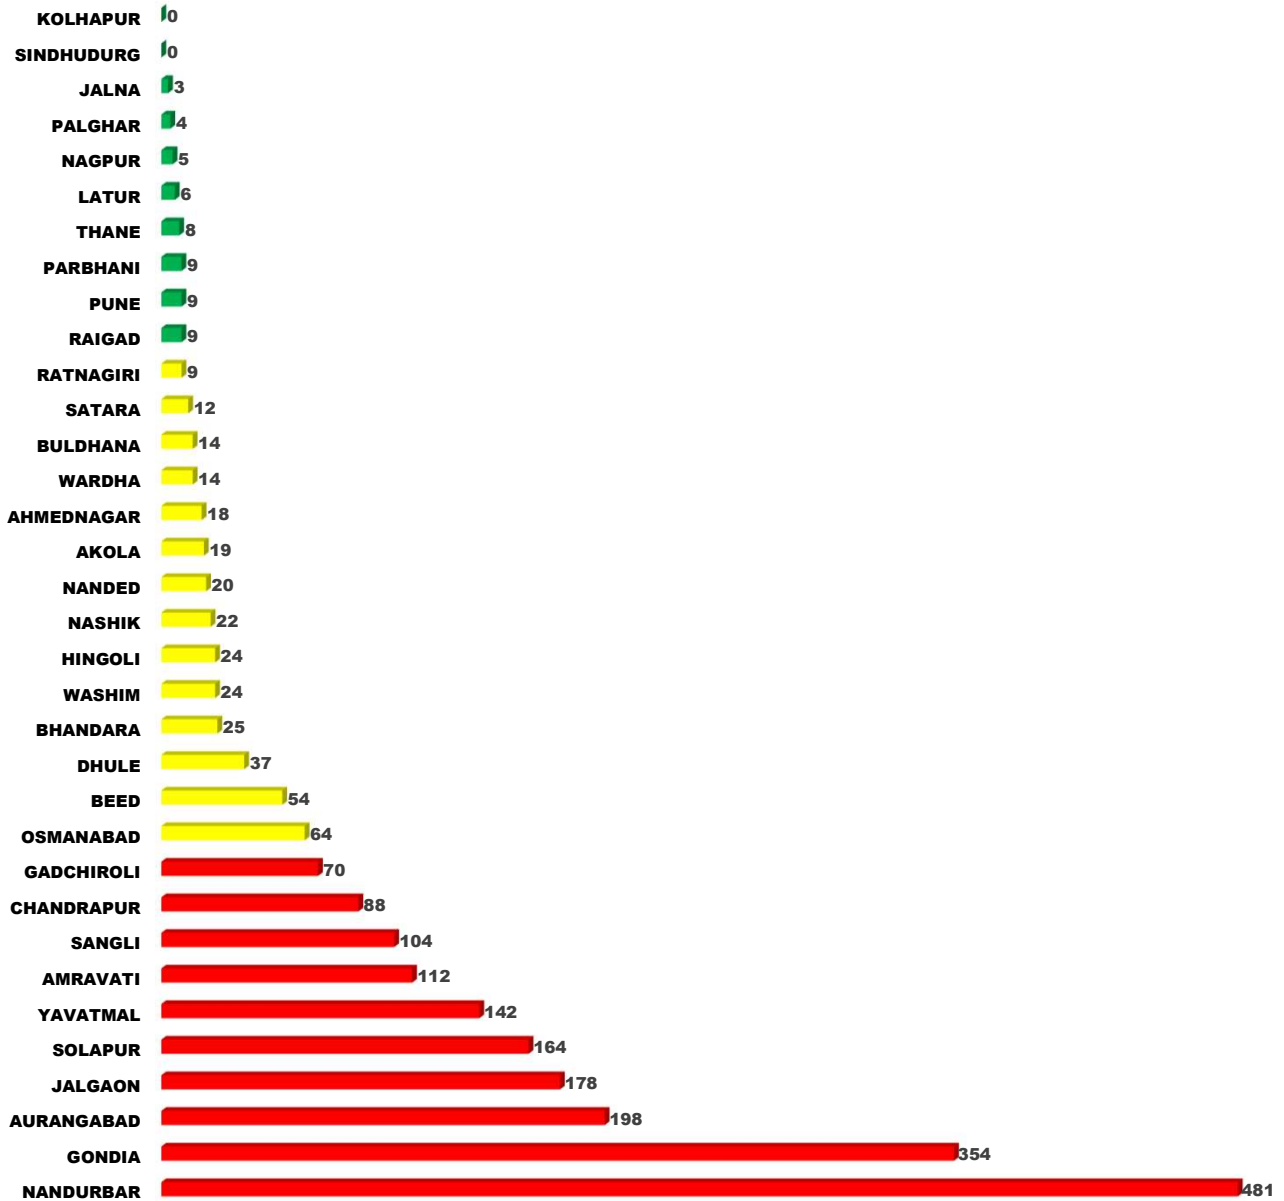


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी (PWL+Awaas Plus)

Sr. No.	District	Target (PWL+Awaas Plus)	10.03.2023	11.03.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	AURANGABAD	36792	36567	36594	27	198
2	AHMEDNAGAR	60789	60752	60771	19	18
3	GADCHIROLI	31639	31564	31569	5	70
4	AKOLA	48794	48775	48775	0	19
5	AMRAVATI	95646	95534	95534	0	112
6	BEED	35324	35270	35270	0	54
7	BULDHANA	44742	44728	44728	0	14
8	HINGOLI	18107	18083	18083	0	24
9	JALNA	24047	24044	24044	0	3
10	KOLHAPUR	17770	17770	17770	0	0
11	LATUR	20799	20793	20793	0	6
12	NANDURBAR	119333	118852	118852	0	481
13	OSMANABAD	14565	14501	14501	0	64
14	PALGHAR	35152	35148	35148	0	4
15	SANGLI	22158	22054	22054	0	104
16	SINDHUDURG	5156	5156	5156	0	0
17	THANE	9606	9598	9598	0	8
18	WARDHA	18671	18657	18657	0	14
19	BHANDARA	65128	65104	65103	-1	25
20	GONDIA	96470	96117	96116	-1	354
21	RATNAGIRI	9924	9916	9915	-1	9
22	YAVATMAL	65390	65249	65248	-1	142
23	DHULE	64912	64877	64875	-2	37
24	RAIGAD	9844	9837	9835	-2	9
25	PARBHANI	19103	19097	19094	-3	9
26	NAGPUR	37281	37280	37276	-4	5
27	SATARA	15514	15507	15502	-5	12
28	WASHIM	20413	20395	20389	-6	24
29	CHANDRAPUR	43236	43155	43148	-7	88
30	PUNE	20989	20988	20980	-8	9
31	JALGAON	79767	79598	79589	-9	178
32	NANDED	69572	69561	69552	-9	20
33	NASHIK	89764	89765	89742	-23	22
34	SOLAPUR	50081	49969	49917	-52	164
Total		1416478	1414261	1414178	51	2300

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	Division	Sanction	10.03.2023	11.03.2023	Daily Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 31.03.23
1	NASHIK DIV.	413829	316569	316827	258	97002	300	4850
2	NAGPUR DIV.	291869	229469	229664	195	62205	194	3110
3	AMRAVATI DIV.	274674	179299	179434	135	95240	201	4762
4	AURANGABAD DIV.	237931	130730	130857	127	107074	210	5354
5	KONKAN DIV.	69652	54367	54464	97	15188	46	759
6	PUNE DIV.	126223	84989	85047	58	41176	69	2059
Total		1414178	995423	996293	870	417885	1019	20894

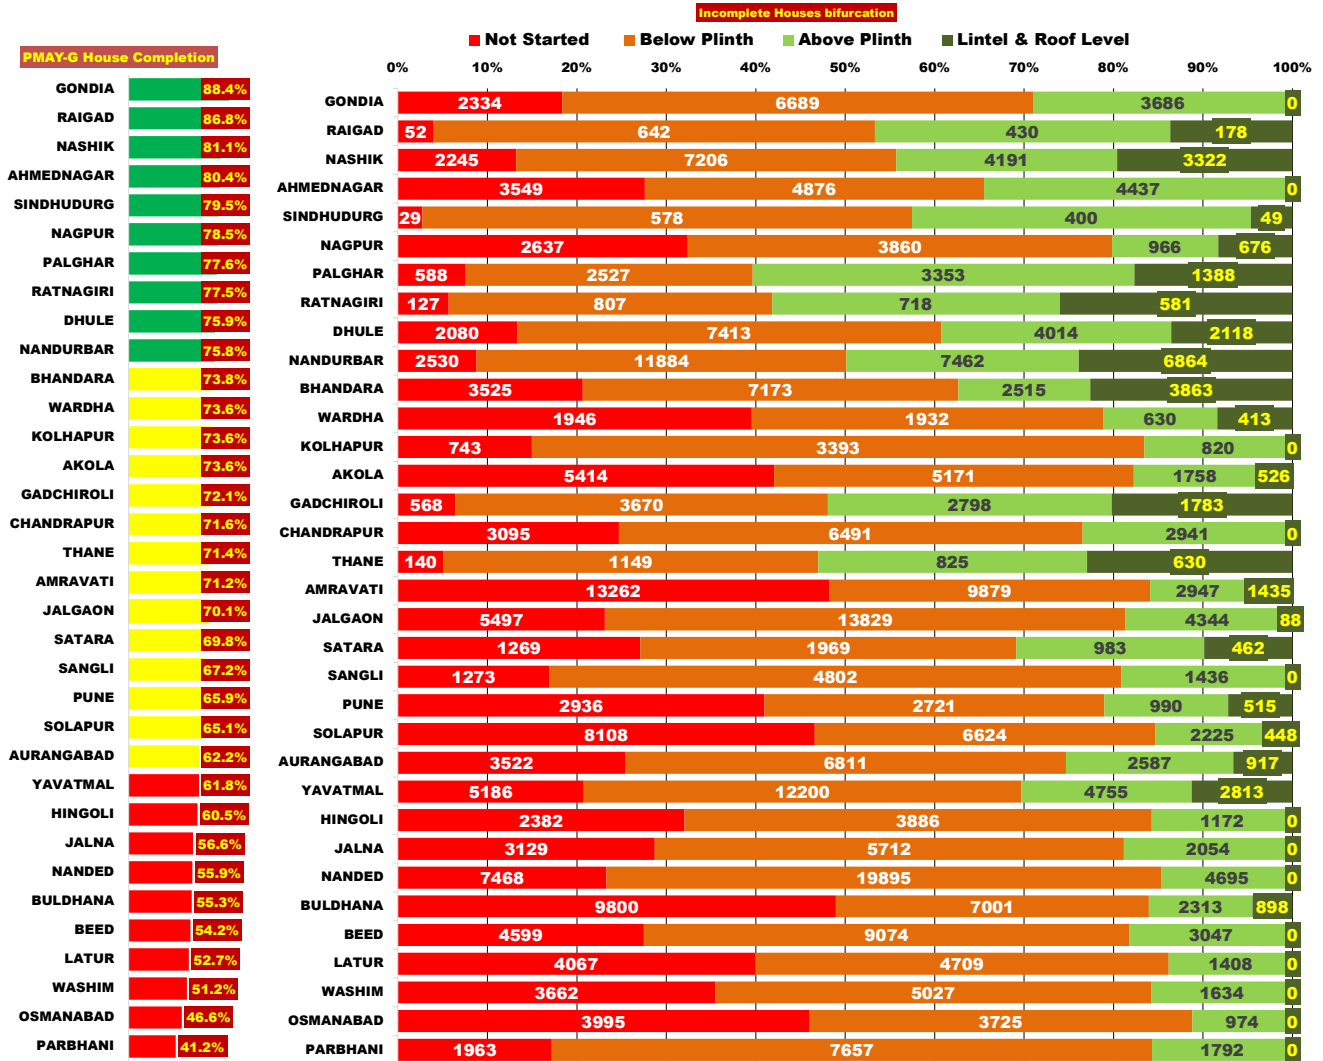


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	District	Sanction	10.03.2023	11.03.2023	Daily Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 31.03.23
1	AHMEDNAGAR	60771	48744	48856	112	11915	97	596
2	NASHIK	89742	72677	72778	101	16964	54	848
3	GONDIA	96116	84867	84945	78	11171	66	559
4	GADCHIROLI	31569	22712	22775	63	8794	27	440
5	RATNAGIRI	9915	7629	7682	53	2233	13	112
6	AMRAVATI	95534	68005	68057	52	27477	58	1374
7	AURANGABAD	36594	22710	22757	47	13837	33	692
8	YAVATMAL	65248	40256	40298	42	24950	62	1248
9	PALGHAR	35148	27266	27292	26	7856	21	393
10	DHULE	64875	49226	49250	24	15625	56	781
11	NANDED	69552	38846	38866	20	30686	50	1534
12	SOLAPUR	49917	32492	32512	20	17405	23	870
13	SATARA	15502	10800	10819	19	4683	13	234
14	WASHIM	20389	10427	10446	19	9943	22	497
15	BULDHANA	44728	24710	24727	17	20001	33	1000
16	HINGOLI	18083	10917	10934	17	7149	18	357
17	JALGAON	79589	55814	55831	17	23758	53	1188
18	BHANDARA	65103	48011	48027	16	17076	36	854
19	CHANDRAPUR	43148	30894	30909	15	12239	41	612
20	WARDHA	18657	13722	13736	14	4921	11	246
21	PARBHANI	19094	7853	7866	13	11228	15	561
22	LATUR	20793	10955	10967	12	9826	22	491
23	SINDHUDURG	5156	4088	4100	12	1056	4	53
24	PUNE	20980	13807	13818	11	7162	11	358
25	JALNA	24044	13590	13599	9	10445	28	522
26	NAGPUR	37276	29263	29272	9	8004	12	400
27	AKOLA	48775	35901	35906	5	12869	25	643
28	BEED	35270	19110	19115	5	16155	26	808
29	KOLHAPUR	17770	13077	13082	5	4688	9	234
30	THANE	9598	6849	6854	5	2744	3	137
31	NANDURBAR	118852	90108	90112	4	28740	39	1437
32	OSMANABAD	14501	6749	6753	4	7748	18	387
33	SANGLI	22054	14813	14816	3	7238	12	362
34	RAIGAD	9835	8535	8536	1	1299	4	65
Total		1414178	995423	996293	870	417885	1019	20894

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी

Sr. No.	Division	Target	10.03.2023	11.03.2023	Daily Achievement	Remaining
1	AMRAVATI DIV.	109702	90879	91592	713	18110
2	AURANGABAD DIV.	199331	158904	159147	243	40184
3	NAGPUR DIV.	116255	87040	87214	174	29041
4	NASHIK DIV.	141360	108437	108452	15	32908
5	KONKAN DIV.	34729	29608	29612	4	5117
6	PUNE DIV.	65334	62911	62909	1	2425
Total		666711	537779	538926	1150	127785

State Scheme Remaining Sanction

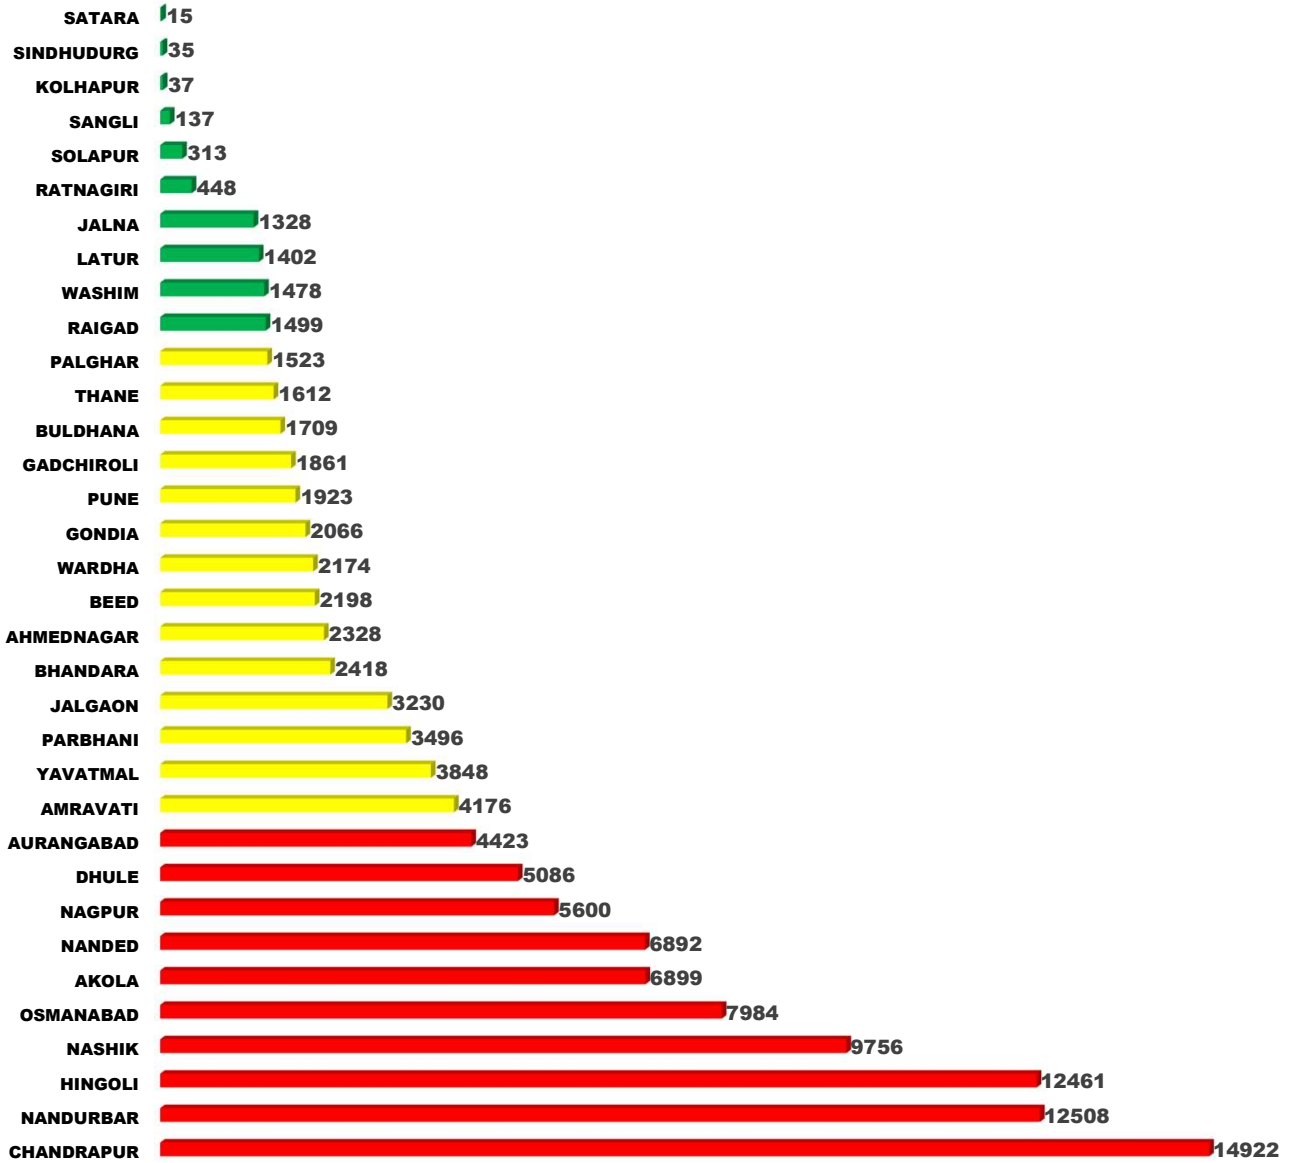


राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी

Sr. No.	District	Target	10.03.2023	11.03.2023	Daily_Achievement	Remaining
1	AKOLA	23681	16169	16782	613	6899
2	GONDIA	14246	12032	12180	148	2066
3	PARBHANI	19784	16176	16288	112	3496
4	YAVATMAL	29681	25751	25833	82	3848
5	LATUR	27171	25697	25769	72	1402
6	NANDED	26760	19829	19868	39	6892
7	WARDHA	13147	10949	10973	24	2174
8	AURANGABAD	26141	21698	21718	20	4423
9	BULDHANA	21616	19889	19907	18	1709
10	JALGAON	25659	22414	22429	15	3230
11	RAIGAD	7406	5903	5907	4	1499
12	GADCHIROLI	16834	14971	14973	2	1861
13	SATARA	10647	10631	10632	1	15
14	AHMEDNAGAR	35298	32970	32970	0	2328
15	AMRAVATI	23224	19048	19048	0	4176
16	BEED	26878	24680	24680	0	2198
17	BHANDARA	17590	15172	15172	0	2418
18	CHANDRAPUR	38147	23225	23225	0	14922
19	DHULE	21790	16704	16704	0	5086
20	HINGOLI	27298	14837	14837	0	12461
21	JALNA	20446	19118	19118	0	1328
22	KOLHAPUR	12565	12528	12528	0	37
23	NAGPUR	16291	10691	10691	0	5600
24	NANDURBAR	26578	14070	14070	0	12508
25	NASHIK	32035	22279	22279	0	9756
26	OSMANABAD	24853	16869	16869	0	7984
27	PALGHAR	11792	10269	10269	0	1523
28	PUNE	14672	12749	12749	0	1923
29	RATNAGIRI	7126	6678	6678	0	448
30	SANGLI	8732	8595	8595	0	137
31	SINDHUDURG	2141	2106	2106	0	35
32	THANE	6264	4652	4652	0	1612
33	WASHIM	11500	10022	10022	0	1478
34	SOLAPUR	18718	18408	18405	-3	313
Total		666711	537779	538926	1150	127785

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	Division	Sanction	10.03.2023	11.03.2023	Daily Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 31.03.23
1	NASHIK DIV.	108452	85981	86089	108	22363	72	1118
2	AURANGABAD DIV.	159147	100895	100965	70	58182	98	2909
3	AMRAVATI DIV.	91592	62224	62294	70	29298	55	1465
4	NAGPUR DIV.	87214	67465	67528	63	19686	45	984
5	PUNE DIV.	62909	51038	51063	25	11846	27	592
6	KONKAN DIV.	29612	22783	22807	24	6805	13	340
Total		538926	390386	390746	360	148180	310	7409

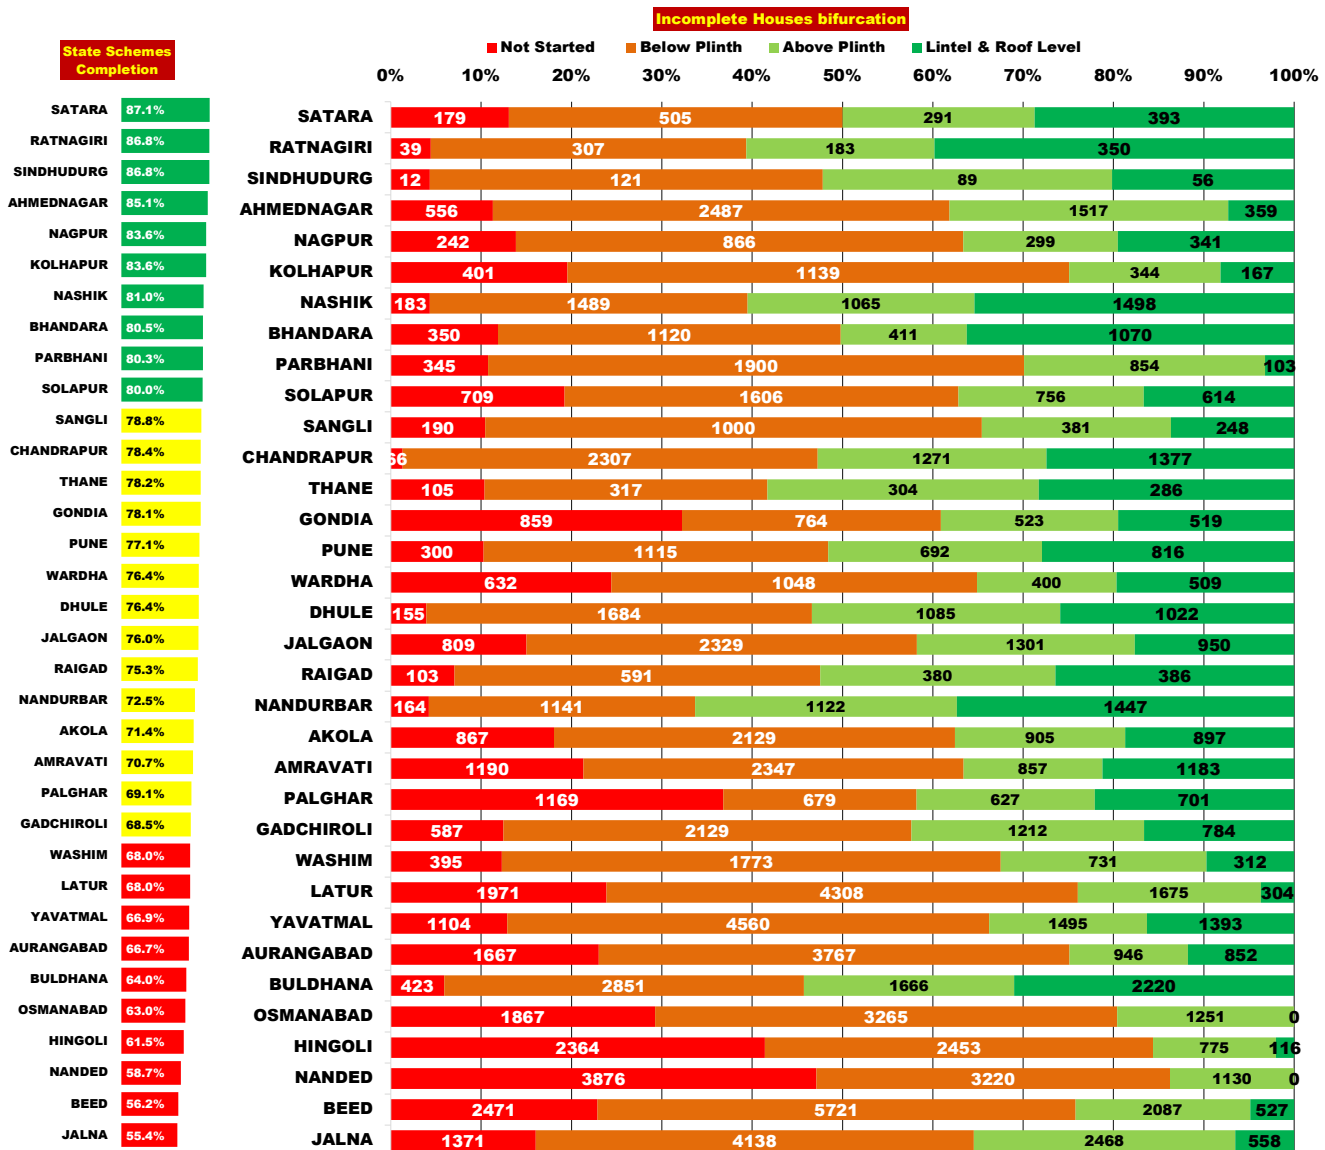

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

Sr. No.	District	Sanction	10.03.2023	11.03.2023	Daily Achievement	Remaining	Avg. Completed Per Day From 20.11.22 to Today	To be Completed in Per Day till 31.03.23
1	AHMEDNAGAR	32970	27979	28051	72	4919	31	246
2	GADCHIROLI	14973	10241	10261	20	4712	9	236
3	WARDHA	10973	8364	8384	20	2589	7	129
4	YAVATMAL	25833	17261	17281	20	8552	13	428
5	BULDHANA	19907	12728	12747	19	7160	16	358
6	NASHIK	22279	18025	18044	19	4235	12	212
7	LATUR	25769	17494	17511	17	8258	12	413
8	JALNA	19118	10567	10583	16	8535	31	427
9	BEED	24680	13862	13874	12	10806	14	540
10	WASHIM	10022	6799	6811	12	3211	7	161
11	AKOLA	16782	11974	11984	10	4798	9	240
12	GONDIA	12180	9505	9515	10	2665	8	133
13	JALGAON	22429	17030	17040	10	5389	11	269
14	AMRAVATI	19048	13462	13471	9	5577	9	279
15	AURANGABAD	21718	14477	14486	9	7232	8	362
16	PALGHAR	10269	7084	7093	9	3176	6	159
17	PUNE	12749	9818	9826	8	2923	6	146
18	THANE	4652	3632	3640	8	1012	2	51
19	PARBHANI	16288	13079	13086	7	3202	4	160
20	SOLAPUR	18405	14713	14720	7	3685	8	184
21	BHANDARA	15172	12216	12221	5	2951	4	148
22	CHANDRAPUR	23225	18199	18204	5	5021	14	251
23	DHULE	16704	12753	12758	5	3946	11	197
24	SATARA	10632	9259	9264	5	1368	5	68
25	HINGOLI	14837	9125	9129	4	5708	6	285
26	OSMANABAD	16869	10629	10633	4	6236	13	312
27	RATNAGIRI	6678	5795	5799	4	879	2	44
28	KOLHAPUR	12528	10474	10477	3	2051	4	103
29	NAGPUR	10691	8940	8943	3	1748	3	87
30	NANDURBAR	14070	10194	10196	2	3874	7	194
31	SANGLI	8595	6774	6776	2	1819	4	91
32	SINDHUDURG	2106	1826	1828	2	278	1	14
33	NANDED	19868	11662	11663	1	8205	10	410
34	RAIGAD	5907	4446	4447	1	1460	3	73
Total		538926	390386	390746	360	148180	310	7409

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - हप्ते वितरण

Sr. No.	Division	1st Installment (Daily Achivement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achivement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achivement)	3rd Installment Remaining
1	AURANGABAD DIV.	355	31095	401	61469	348	17729
2	NAGPUR DIV.	220	13908	339	29815	240	13536
3	AMRAVATI DIV.	226	37260	339	39278	151	13407
4	PUNE DIV.	86	14196	107	19509	174	6454
5	NASHIK DIV.	62	15901	168	45208	114	24448
6	KONKAN DIV.	13	933	97	5703	101	5726
	Total	962	113293	1451	200982	1128	81300

PMAY-G 1st Ins Pending

SINDHUDURG	29
RAIGAD	49
RATNAGIRI	127
THANE	140
GADCHIROLI	543
PALGHAR	588
KOLHAPUR	743
SANGLI	1140
SATARA	1269
WARDHA	1946
PARBHANI	1963
DHULE	2080
NASHIK	2245
GONDIA	2334
HINGOLI	2382
NAGPUR	2502
NANDURBAR	2530
PUNE	2936
CHANDRAPUR	3058
JALNA	3099
AURANGABAD	3522
BHANDARA	3525
AHMEDNAGAR	3549
WASHIM	3659
OSMANABAD	3995
LATUR	4067
BEED	4599
YAVATMAL	5182
AKOLA	5414
JALGAON	5497
NANDED	7468
SOLAPUR	8108
BULDHANA	9789
AMRAVATI	13216

PMAY-G 2nd Ins Pending

SINDHUDURG	578
RAIGAD	642
RATNAGIRI	807
THANE	1149
WARDHA	1932
SATARA	1969
PALGHAR	2527
PUNE	2721
KOLHAPUR	3393
GADCHIROLI	3670
OSMANABAD	3725
NAGPUR	3860
HINGOLI	3886
LATUR	4709
SANGLI	4802
AHMEDNAGAR	4876
WASHIM	5027
AKOLA	5171
JALNA	5712
CHANDRAPUR	6491
SOLAPUR	6624
GONDIA	6689
AURANGABAD	6811
BULDHANA	7001
BHANDARA	7173
NASHIK	7206
DHULE	7413
PARBHANI	7657
BEED	9074
AMRAVATI	9879
NANDURBAR	11884
YAVATMAL	12200
JALGAON	13829
NANDED	19895

PMAY-G 3rd Ins Pending

SINDHUDURG	400
RAIGAD	430
WARDHA	630
RATNAGIRI	718
KOLHAPUR	820
THANE	825
NAGPUR	966
OSMANABAD	974
SATARA	983
PUNE	990
HINGOLI	1172
LATUR	1408
SANGLI	1436
WASHIM	1634
AKOLA	1758
PARBHANI	1792
JALNA	2054
SOLAPUR	2225
BULDHANA	2313
BHANDARA	2515
AURANGABAD	2587
GADCHIROLI	2798
CHANDRAPUR	2941
AMRAVATI	2947
BEED	3047
PALGHAR	3353
GONDIA	3686
DHULE	4014
NASHIK	4191
JALGAON	4344
AHMEDNAGAR	4437
NANDED	4695
YAVATMAL	4755
NANDURBAR	7462

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - हप्ते वितरण

Sr. No.	District	1st Installment (Daily Achivement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achivement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achivement)	3rd Installment Remaining
1	NANDED	85	7468	166	19895	217	4695
2	GONDIA	89	2334	143	6689	81	3686
3	YAVATMAL	83	5182	112	12200	42	4755
4	LATUR	131	4067	52	4709	49	1408
5	BEED	52	4599	85	9074	59	3047
6	AMRAVATI	61	13216	62	9879	31	2947
7	BULDHANA	32	9789	77	7001	43	2313
8	NANDURBAR	34	2530	72	11884	44	7462
9	PARBHANI	83	1963	48	7657	10	1792
10	CHANDRAPUR	56	3058	47	6491	34	2941
11	BHANDARA	10	3525	67	7173	53	2515
12	AKOLA	45	5414	54	5171	30	1758
13	PUNE	13	2936	25	2721	64	990
14	SANGLI	21	1140	38	4802	41	1436
15	SOLAPUR	37	8108	22	6624	35	2225
16	NAGPUR	15	2502	41	3860	25	966
17	THANE	6	140	3	1149	63	825
18	DHULE	0	2080	46	7413	25	4014
19	SATARA	15	1269	22	1969	34	983
20	GADCHIROLI	9	543	21	3670	39	2798
21	WARDHA	41	1946	20	1932	8	630
22	AHMEDNAGAR	10	3549	22	4876	17	4437
23	PALGHAR	4	588	39	2527	6	3353
24	RATNAGIRI	2	127	28	807	15	718
25	WASHIM	5	3659	34	5027	5	1634
26	NASHIK	5	2245	21	7206	17	4191
27	AURANGABAD	3	3522	23	6811	8	2587
28	JALNA	1	3099	27	5712	5	2054
29	JALGAON	13	5497	7	13829	11	4344
30	SINDHUDURG	0	29	23	578	6	400
31	RAIGAD	1	49	4	642	11	430
32	KOLHAPUR	0	743	0	3393	0	820
33	HINGOLI	-5	2382	0	3886	-1	1172
34	OSMANABAD	-10	3995	0	3725	0	974
	Total	962	113293	1451	200982	1128	81300

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण - हप्ते वितरण

Sr. No.	Division	1st Installment (Daily Achievement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achievement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achievement)	3rd Installment Remaining
1	AURANGABAD DIV.	604	15932	245	28772	327	11186
2	NASHIK DIV.	102	1867	150	9130	175	6090
3	AMRAVATI DIV.	63	3979	129	13660	129	5654
4	PUNE DIV.	20	1779	60	5365	57	2464
5	NAGPUR DIV.	7	2736	29	8234	46	4116
6	KONKAN DIV.	2	1428	17	2015	5	1583
	Total	798	27721	630	67176	739	31093

State Schemes 1st Ins Pending

SINDHUDURG	12
RATNAGIRI	39
CHANDRAPUR	66
RAIGAD	103
THANE	105
DHULE	155
NANDURBAR	164
SATARA	179
NASHIK	183
SANGLI	190
NAGPUR	242
PUNE	300
PARBHANI	345
BHANDARA	350
WASHIM	395
KOLHAPUR	401
BULDHANA	423
AHMEDNAGAR	556
GADCHIROLI	587
WARDHA	632
SOLAPUR	709
JALGAON	809
GONDIA	859
AKOLA	867
YAVATMAL	1104
PALGHAR	1169
AMRAVATI	1190
JALNA	1371
AURANGABAD	1667
OSMANABAD	1867
LATUR	1971
HINGOLI	2364
BEED	2471
NANDED	3876

State Schemes 2nd Ins Pending

SINDHUDURG	121
RATNAGIRI	307
THANE	317
SATARA	505
RAIGAD	591
PALGHAR	679
GONDIA	764
NAGPUR	866
SANGLI	1000
WARDHA	1048
PUNE	1115
BHANDARA	1120
KOLHAPUR	1139
NANDURBAR	1141
NASHIK	1489
SOLAPUR	1606
DHULE	1684
WASHIM	1773
PARBHANI	1900
GADCHIROLI	2129
AKOLA	2129
CHANDRAPUR	2307
JALGAON	2329
AMRAVATI	2347
HINGOLI	2453
AHMEDNAGAR	2487
BULDHANA	2851
NANDED	3220
OSMANABAD	3265
AURANGABAD	3767
JALNA	4138
LATUR	4308
YAVATMAL	4560
BEED	5721

State Schemes 3rd Ins Pending

SINDHUDURG	89
RATNAGIRI	183
SATARA	291
NAGPUR	299
THANE	304
KOLHAPUR	344
RAIGAD	380
SANGLI	381
WARDHA	400
BHANDARA	411
GONDIA	523
PALGHAR	627
PUNE	692
WASHIM	731
SOLAPUR	756
HINGOLI	775
PARBHANI	854
AMRAVATI	857
AKOLA	905
AURANGABAD	946
NASHIK	1065
DHULE	1085
NANDURBAR	1122
NANDED	1130
GADCHIROLI	1212
OSMANABAD	1251
CHANDRAPUR	1271
JALGAON	1301
YAVATMAL	1495
AHMEDNAGAR	1517
BULDHANA	1666
LATUR	1675
BEED	2087
JALNA	2468

राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण -हप्ते वितरण

Sr. No.	District	1st Installment (Daily Achievement)	1st Installment Remaining	2nd Installment (Daily Achievement)	2nd Installment Remaining	3rd Installment (Daily Achievement)	3rd Installment Remaining
1	LATUR	188	1971	68	4308	86	1675
2	OSMANABAD	177	1867	32	3265	41	1251
3	JALNA	52	1371	42	4138	93	2468
4	BULDHANA	21	423	74	2851	71	1666
5	AHMEDNAGAR	64	556	26	2487	47	1517
6	BEED	74	2471	32	5721	31	2087
7	HINGOLI	79	2364	24	2453	31	775
8	JALGAON	33	809	26	2329	40	1301
9	NANDURBAR	1	164	37	1141	41	1122
10	DHULE	4	155	39	1684	24	1085
11	PARBHANI	3	345	35	1900	22	854
12	YAVATMAL	4	1104	29	4560	21	1495
13	NASHIK	0	183	22	1489	23	1065
14	AMRAVATI	10	1190	16	2347	13	857
15	AURANGABAD	16	1667	4	3767	16	946
16	SANGLI	10	190	8	1000	18	381
17	AKOLA	1	867	6	2129	24	905
18	WASHIM	27	395	4	1773	0	731
19	KOLHAPUR	4	401	11	1139	15	344
20	NANDED	15	3876	8	3220	7	1130
21	SATARA	-2	179	13	505	12	291
22	PUNE	2	300	14	1115	8	692
23	SOLAPUR	4	709	14	1606	4	756
24	GADCHIROLI	6	587	6	2129	9	1212
25	GONDIA	1	859	7	764	13	523
26	WARDHA	0	632	6	1048	13	400
27	CHANDRAPUR	0	66	8	2307	5	1271
28	THANE	2	105	11	317	0	304
29	SINDHUDURG	0	12	3	121	2	89
30	BHANDARA	0	350	1	1120	3	411
31	NAGPUR	0	242	1	866	3	299
32	PALGHAR	0	1169	1	679	1	627
33	RAIGAD	0	103	1	591	1	380
34	RATNAGIRI	0	39	1	307	1	183
	Total	798	27721	630	67176	739	31093
